CONSTRUCCION SUBESTACION 115 KV - **Reportes Ediciones - Newsletter Proyectos & Datos**

CONSTRUCCION SUBESTACION 115 KV - **Proyectos & Datos (Edición 1)**

Diagnóstico Inicial y Calidad de Datos de Obra

Propósito: Exploración inicial y validación de la calidad de los datos.

BAC

$4.126.638

EAC

$5.032.485

BAC_CSV por Capitulo

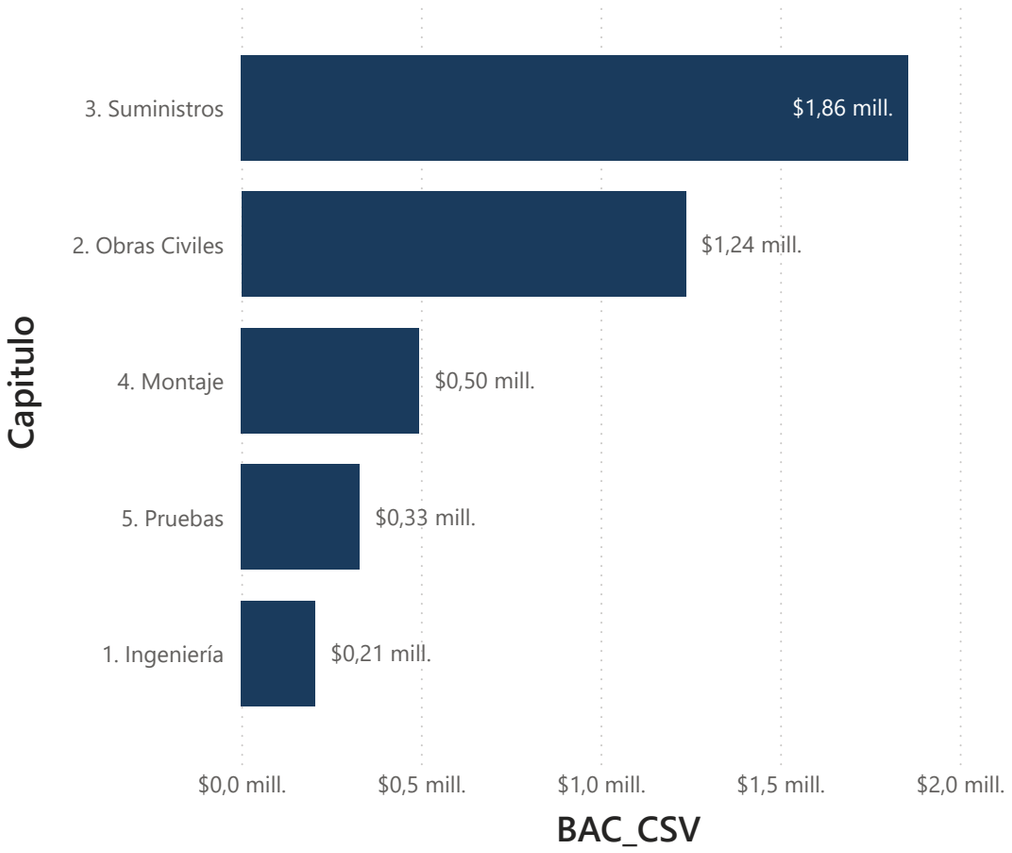

Informacion Actividades

Actividad	BAC_CSV	PV_Acum	EV_Acum	AC_Acum	CPI_CSV	SPI_CSV
Acabados	$61.899	$17.682	$16.974	$22.338	0,76	0,96
Accesorios Trafo	$22.925	$0	$0	$0	0,00	0,00
Acero Porticos	$41.266	$28.369	$27.225	$35.827	0,76	0,96
Acta Entrega	$6.877	$0	$0	$0	0,00	0,00
Aire Acondicionado	$61.899	$17.682	$16.974	$22.338	0,76	0,96
Aisladores Soporte	$147.379	$73.680	$58.198	$61.264	0,95	0,79
Alineacion	$22.925	$0	$0	$0	0,00	0,00
Alumbrado	$8.842	$8.840	$8.840	$8.840	1,00	1,00
Aprobacion Trazado	$6.877	$6.877	$6.877	$22.920	0,30	1,00
Banco Baterias	$68.088	$21.712	$16.822	$17.708	0,95	0,77
Bandejas	$17.685	$0	$0	$0	0,00	0,00
Bandejas Portacables	$34.388	$10.505	$7.775	$8.188	0,95	0,74
Bases GIS	$41.266	$28.369	$27.225	$35.827	0,76	0,96
Basica Control	$6.877	$6.877	$6.877	$15.462	0,44	1,00
BT en Trafo	$17.685	$0	$0	$0	0,00	0,00
Cable Cobre Malla	$34.388	$10.505	$7.775	$8.188	0,95	0,74
Cable Control	$34.388	$10.505	$7.775	$8.188	0,95	0,74
Cable XLPE	$34.388	$10.505	$7.775	$8.188	0,95	0,74
Cableado Interpanel	$16.506	$0	$0	$0	0,00	0,00
Cables	$8.842	$8.840	$8.840	$8.840	1,00	1,00
Total	**$4.126.638**	**$1.784.771**	**$1.537.173**	**$1.874.601**	**0,82**	**0,86**

CONSTRUCCION SUBESTACION 115 KV - **Proyectos & Datos (Edición 2)**

Panel de Control de Valor Ganado (EVM) y Desempeño

Propósito: Control directivo y salud del proyecto utilizando el Esquema Estrella.

BAC

$4.126.638

EAC

$5.032.485

Curva de Seguimiento

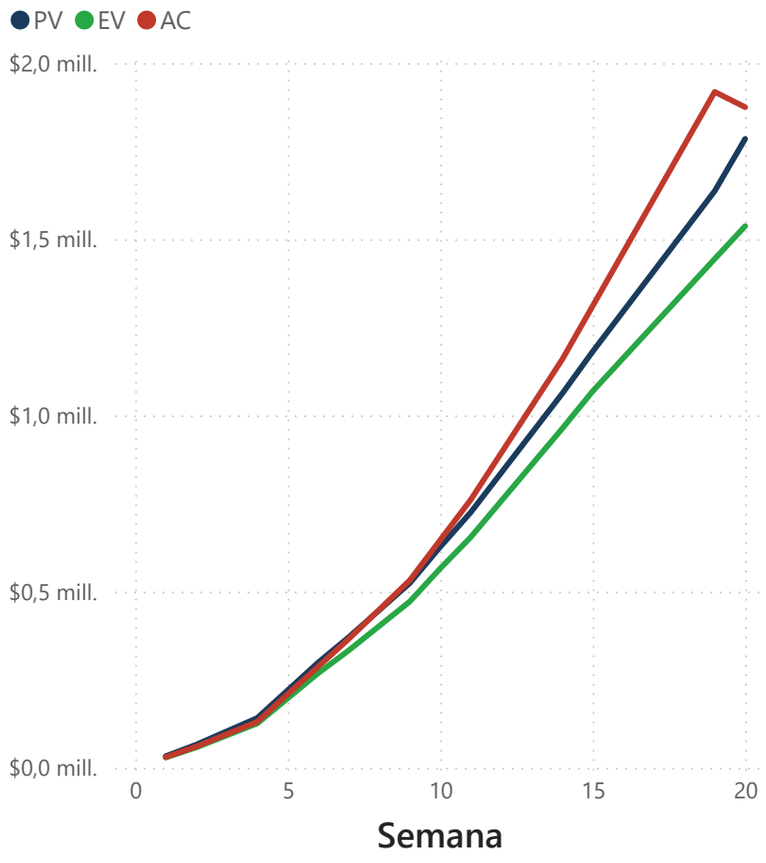

Salud del Proyecto por Capitulos

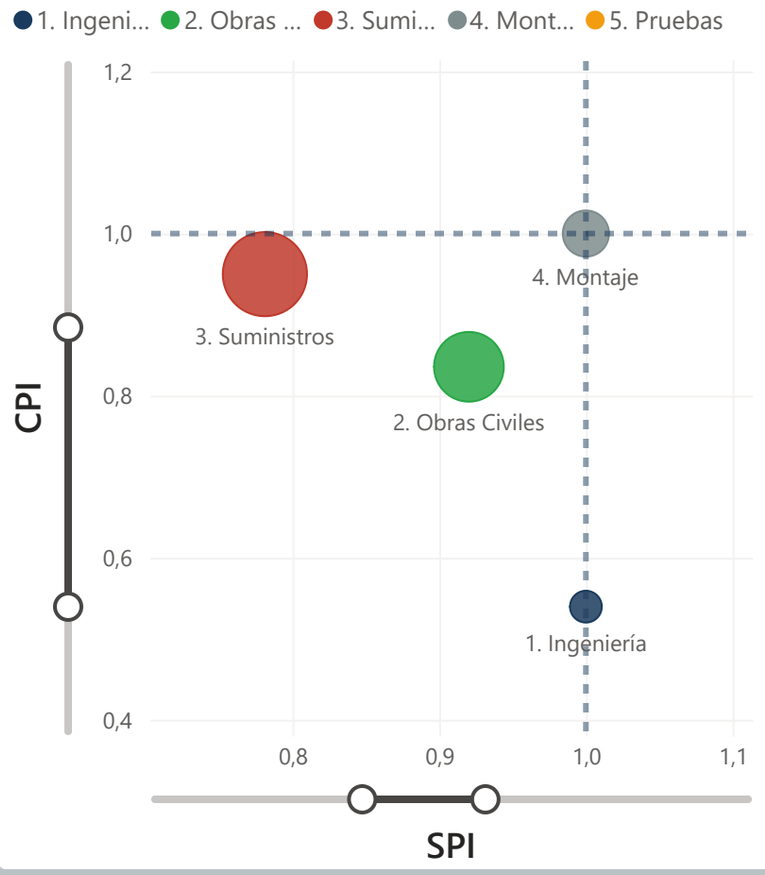

Comentarios Operativos

Capitulo	Comentario_Operativo
2. Obras Civiles	Saturacion de terreno. 2 bombas extra.
3. Suministros	Retraso en transito maritimo notificado.
3. Suministros	Reprogramando contratista de montaje.
1. Ingeniería	No iniciada
2. Obras Civiles	No iniciada
3. Suministros	No iniciada
4. Montaje	No iniciada
5. Pruebas	No iniciada
2. Obras Civiles	Nivel freatico detectado. Inicia achique.

Comentarios Administrativos

Capitulo	Comentario_Administrativo
1. Ingeniería	Costo cerrado.
1. Ingeniería	Ejecucion conforme.
1. Ingeniería	No iniciada
2. Obras Civiles	Alerta presupuestal en obra civil.
2. Obras Civiles	Alquiler maquinaria impacta CPI.
2. Obras Civiles	Aprobacion horas extras achique.
2. Obras Civiles	Costo cerrado.
2. Obras Civiles	Costo directo elevado por ACPM

CONSTRUCCION SUBESTACION 115 KV - **Proyectos & Datos (Edición 2)**

Panel de Control de Gobernanza Predictiva - (Semana 20)

*Propósito: aquí el centro de atención no es solo el pasado (EVM histórico), sino la **proyección estocástica**.*

Reserva Lineal (EVM):

$905.847

Reserva Monte Carlo (P90):

$1.935.779

Analisis de Escenarios

Metricas	Costo_USD	Semanas
P10_Optimista	$4.963.882	47,25
Meta	$4.126.638	52,00
P50_Mediana	$5.386.049	52,99
P90_Conservador	$6.062.417	60,41

La **Reserva Lineal ($905k)** es lo mínimo que se gastará de más si no se cometen nuevos errores. Sin embargo, la **Reserva Monte Carlo ($1.9M)** es lo que realmente cubriría todos los riesgos. La diferencia de $1M es el **Precio del Riesgo Geológico** que el modelo ha detectado

Análisis Sensitivo: Probabilidad de Cumplimiento por Frente Crítico

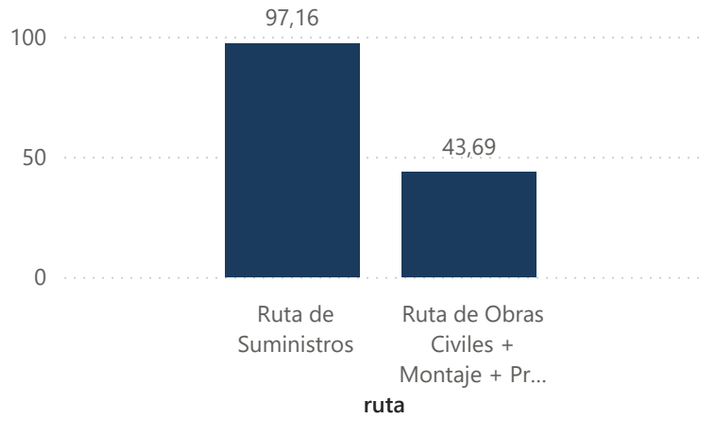

Pronóstico Estocástico de Plazo

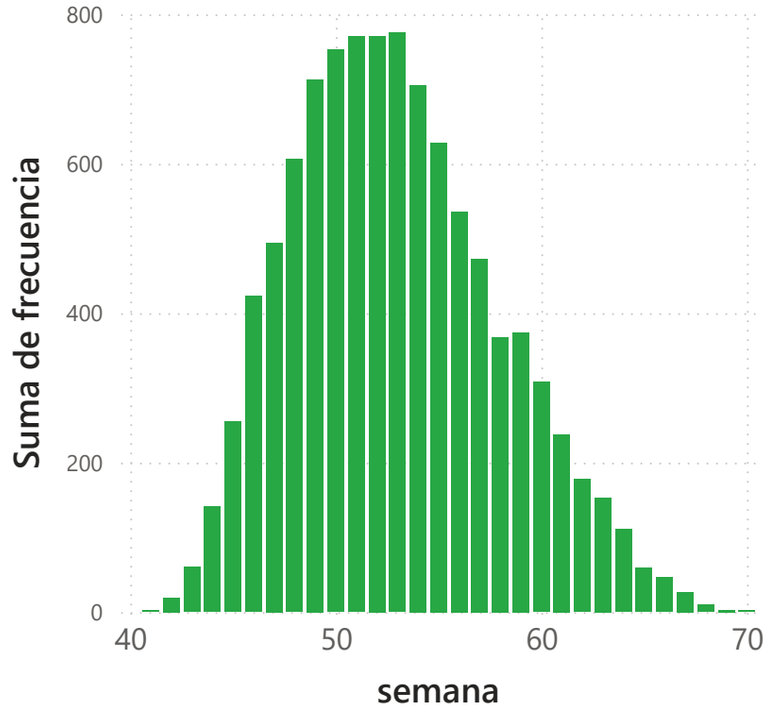
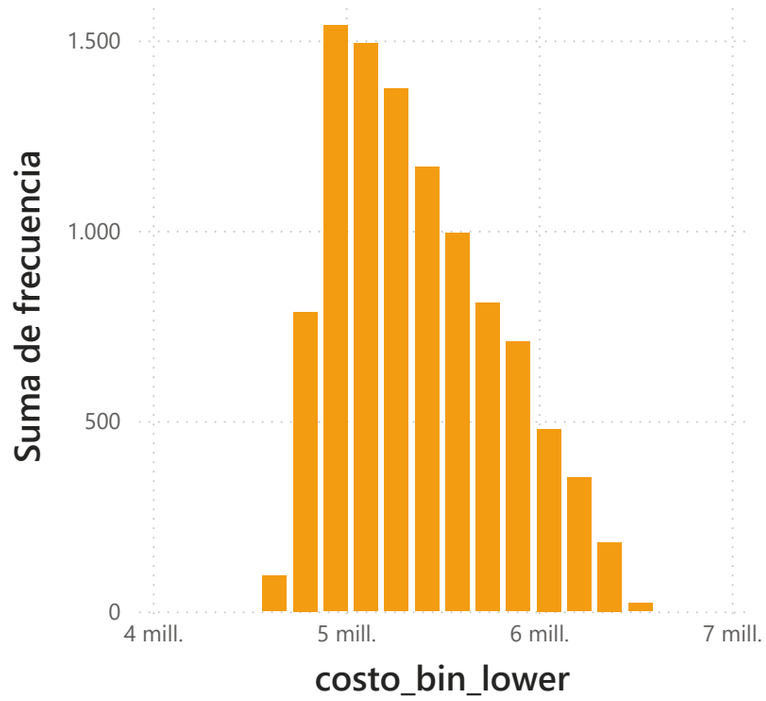
Pronóstico Estocástico de Costo
