99.8%
4.2GW
245
DATA ANALYTICS CONTROL DASHBOARD
14:38 UTC | SEP 24 2024
Grid Availability
Peak Load
Substations
POWER GRID MONITORING | NETWORK HEALTH | OPERATIONAL INTELLIGENCE
GENERATION MIX (Renewable 65%)
TRANSMISSION EFFICIENCY
REAL-TIME LOAD (MW/kV)
DYNAMIC KPIs
POWER NETWORK

CONSTRUCCION SUBESTACION 115 KV - **Proyectos & Datos (Edición 1)**

Diagnóstico Inicial y Calidad de Datos de Obra

Propósito: Exploración inicial y validación de la calidad de los datos.

BAC

$4.126.638

EAC

$5.032.485

BAC_CSV por Capitulo

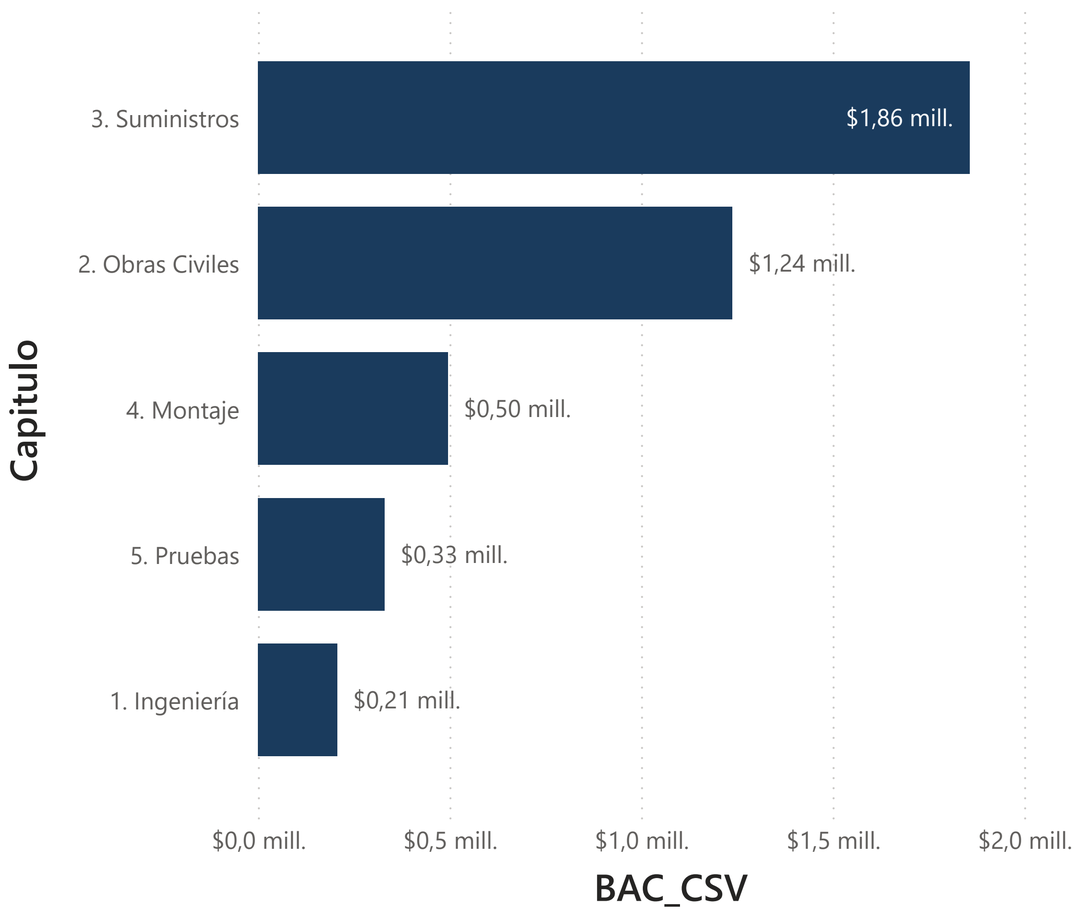

Informacion Actividades

Actividad	BAC_CSV	PV_Acum	EV_Acum	AC_Acum	CPI_CSV	SPI_CSV
Acabados	$61.899	$17.682	$16.974	$22.338	0,76	0,96
Accesorios Trafo	$22.925	$0	$0	$0	0,00	0,00
Acero Porticos	$41.266	$28.369	$27.225	$35.827	0,76	0,96
Acta Entrega	$6.877	$0	$0	$0	0,00	0,00
Aire Acondicionado	$61.899	$17.682	$16.974	$22.338	0,76	0,96
Aisladores Soporte	$147.379	$73.680	$58.198	$61.264	0,95	0,79
Alineacion	$22.925	$0	$0	$0	0,00	0,00
Alumbrado	$8.842	$8.840	$8.840	$8.840	1,00	1,00
Aprobacion Trazado	$6.877	$6.877	$6.877	$22.920	0,30	1,00
Banco Baterias	$68.088	$21.712	$16.822	$17.708	0,95	0,77
Bandejas	$17.685	$0	$0	$0	0,00	0,00
Bandejas Portacables	$34.388	$10.505	$7.775	$8.188	0,95	0,74
Bases GIS	$41.266	$28.369	$27.225	$35.827	0,76	0,96
Basica Control	$6.877	$6.877	$6.877	$15.462	0,44	1,00
BT en Trafo	$17.685	$0	$0	$0	0,00	0,00
Cable Cobre Malla	$34.388	$10.505	$7.775	$8.188	0,95	0,74
Cable Control	$34.388	$10.505	$7.775	$8.188	0,95	0,74
Cable XLPE	$34.388	$10.505	$7.775	$8.188	0,95	0,74
Cableado Interpanel	$16.506	$0	$0	$0	0,00	0,00
Total	**$4.126.638**	**$1.784.771**	**$1.537.173**	**$1.874.601**	**0,82**	**0,86**

CONSTRUCCION SUBESTACION 115 KV - **Proyectos & Datos (Edición 2)**

Panel de Control de Valor Ganado (EVM) y Desempeño

Propósito: Control directivo y salud del proyecto utilizando el Esquema Estrella.

BAC

$4.126.638

EAC

$5.032.485

Curva de Seguimiento

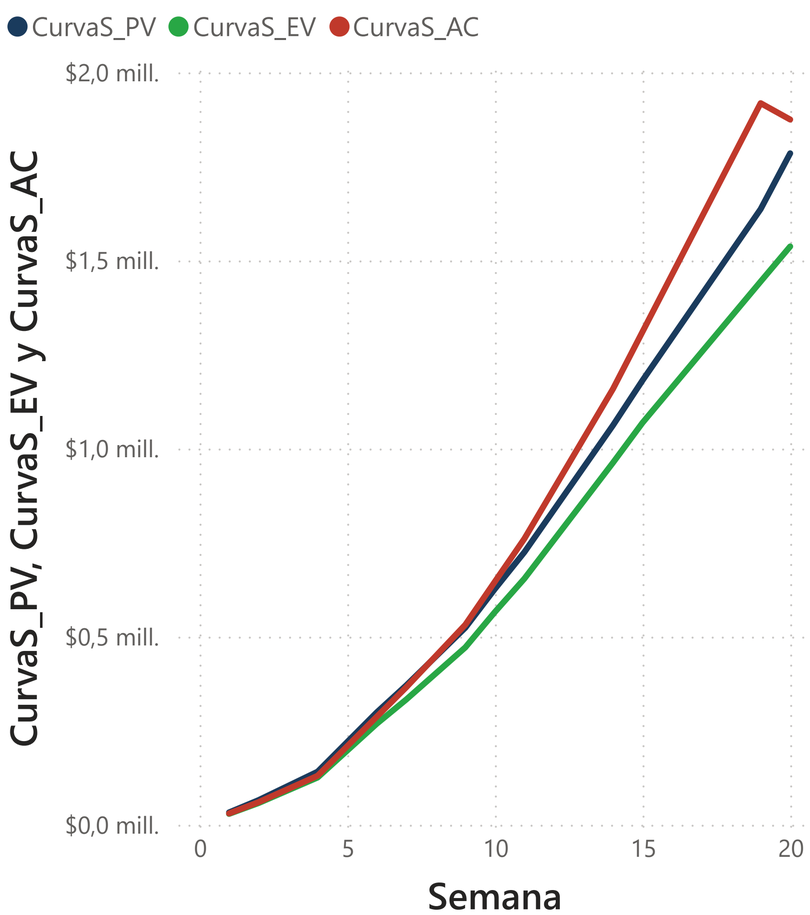

Salud del Proyecto por Capitulos

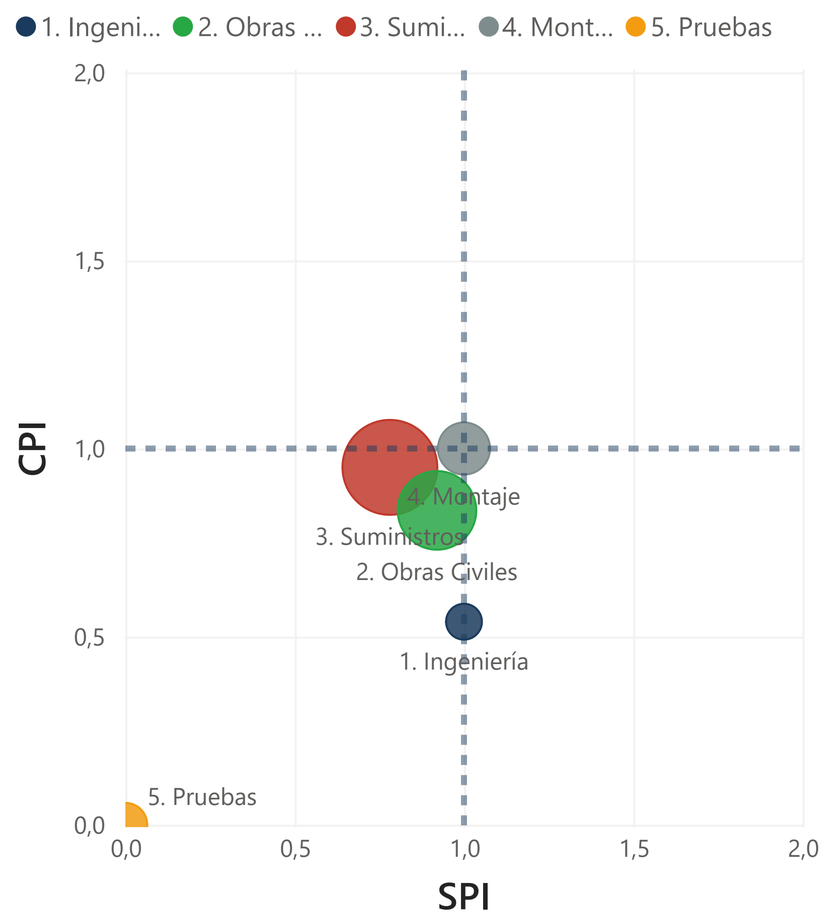

Comentarios Operativos

Capitulo	Comentario_Operativo
2. Obras Civiles	Saturacion de terreno. 2 bombas extra.
3. Suministros	Retraso en transito maritimo notificado.
3. Suministros	Reprogramando contratista de montaje.
1. Ingeniería	No iniciada
2. Obras Civiles	No iniciada
3. Suministros	No iniciada
4. Montaje	No iniciada
5. Pruebas	No iniciada
2. Obras Civiles	Nivel freatico detectado. Inicia achique.

Comentarios Administrativos

Capitulo	Comentario_Administrativo
1. Ingeniería	Costo cerrado.
1. Ingeniería	Ejecucion conforme.
1. Ingeniería	No iniciada
2. Obras Civiles	Alerta presupuestal en obra civil.
2. Obras Civiles	Alquiler maquinaria impacta CPI.
2. Obras Civiles	Aprobacion horas extras achique.
2. Obras Civiles	Costo cerrado.
2. Obras Civiles	Costo directo elevado por ACPM
